

Projektbericht Außenanlage

Index


Projektbericht Außenanlage	1
Anlage:	1
Idee:	1
Material:	2
Durchführung:	4
Ergebnis:	5
Lieferanten	7
Kosten.....	7

Anlage:

Auf dem Ösch 14, 78267 Aach

Idee:

Terrasse und Carport mit Naturstein verlegen. Muster in Schneckenform (Kreise hat jeder) dreifarbig (rot-schwarz-grau).

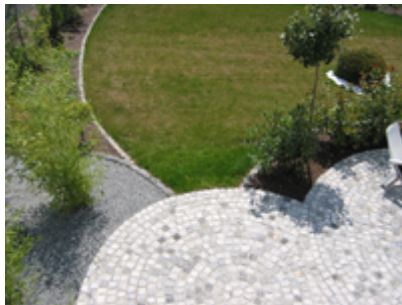

Wegen dem Bebauungsplan, darf der Boden NICHT versiegelt werden.

Material:

Bayerwald Granit Natursteine



Kies



PCI Repahaft Mörtel Haftbrücke (http://www.pci-augsburg.eu/produkte/produktinformationen/r.html?tx_mmdb%5Bproduct%5D=313&cHash=35968bcc03)



Beton Dränbeton C25



Pflasterfugenmörtel VDW 800 GftK (http://www.gftk-info.de/pages/produkte/PDF2009/vdw_800_inhalt_08.pdf)

Durchführung:

- Boden eben und mit Kies befüllen.
- Betonschicht (5cm) aufbringen
- Steine mit Haftmörtel auf die Betonschicht legen.



- Untergrund wässern
- Verfugungsmaterial anrühren und mit dem Besen einstreichen.
- Restmaterial abkehren
- Außenrand mit Estrichbeton befestigen

Ergebnis:

Carport



Terrasse



Teichbrücke



Lieferanten

Natursteine und Beratung

<http://www.meichle-mohr.de/anLand/schleith.html>

Steine und Estrichbeton für Außeneinfassung mit Beratung

<http://www.raiffeisen-baucenter.de/>

Dränbeton, Verfugungsmaterial und Beratung

<http://www.buecheler-martin.de/index.php>

Beratung und Lieferantenempfehlung

Klas Natursteine Aach

Kosten

Beton und Verfugung ca. 3000.- €

Steine ca. 3000.- €

Estrich, Steine ca. 250.- €

Werkzeug, Kleinmaterial ca. 250.- €

Gesamt 6.500.- €

Arbeitszeit 400 Stunden verteilt auf 3 Jahre

Kostenvoranschlag Landschaftsgestalter ca. 25.000.-€
